


鹏华基金3楼餐厅室内装修项目-进度计划

标识号	Task Name	工期	开始时间	完成时间	2023年第二季度				2023年第三季度					
					3	4	5	6	7	8	9			
1	鹏华基金3楼餐厅室内装修项目-进度计划	123 d	2023年5月9日	2023年9月8日	鹏华基金3楼餐厅室内装修项目-进度计划									
2	装饰总包招标及各专业分包招标阶段	28 d	2023年5月9日	2023年6月5日	装饰总包招标及各专业分包招标阶段									
3	鹏华基金招标文件发出	3 d	2023年5月9日	2023年5月11日										
4	监理公司回标, 提供方案及报价 (含澄清)	5 d	2023年5月12日	2023年5月16日										
5	鹏华基金公司评标及发出监理单位中标通知书	3 d	2023年5月17日	2023年5月19日										
6	总包回标, 提供深化设计方案及详细报价 (含澄清, 踏勘)	7 d	2023年5月12日	2023年5月18日										
7	鹏华基金公司进行招标分析及确认	11 d	2023年5月19日	2023年5月29日										
8	鹏华基金公司确认总包中标人并发出中标通知书	0 d	2023年5月29日	2023年5月29日										
9	深化设计、效果图与施工图确认	5 d	2023年5月30日	2023年6月3日										
10	材料样板确认	5 d	2023年5月30日	2023年6月3日										
11	确认总包合同报价及总包合同签订	7 d	2023年5月30日	2023年6月5日										
12	专业分包家具、弱电、空调、消防招标流程	7 d	2023年5月12日	2023年5月18日										
13	确认各类分包商合同报价及合同签订	17 d	2023年5月19日	2023年6月4日										
14	前期政府报建阶段	23 d	2023年5月30日	2023年6月21日										
15	报审图纸及报审资料准备 (含盖章)	7 d	2023年5月30日	2023年6月5日										
16	提交物业申报的图纸和文件	5 d	2023年6月6日	2023年6月10日										
17	政府报建并获得施工许可证	15 d	2023年6月6日	2023年6月20日										
18	大楼物业报建完成并取得物业施工许可	1 d	2023年6月21日	2023年6月21日										
19	较长货期采购阶段	35 d	2023年6月15日	2023年7月19日										
20	家具采购及生产	35 d	2023年6月15日	2023年7月19日										
21	安防、IT、AV等采购及生产	35 d	2023年6月15日	2023年7月19日										
22	现场施工阶段	80 d	2023年6月12日	2023年8月30日										
23	现场收楼	1 d	2023年6月12日	2023年6月12日										
24	现场原有装修拆除及清理	5 d	2023年6月13日	2023年6月17日										
25	现场放线与验线	2 d	2023年6月17日	2023年6月18日										
26	现场施工	60 d	2023年6月18日	2023年8月16日										
27	IT、安防、AV、CCTV等设备进场安装与调试	30 d	2023年7月9日	2023年8月7日										
28	饰面安装及调试	10 d	2023年8月11日	2023年8月20日										
29	厨房设备及家具安装完成及调试	10 d	2023年8月21日	2023年8月30日										
30	相关政府及机构报验工作	15 d	2023年8月23日	2023年9月6日										
31	大楼物业竣工验收	7 d	2023年8月31日	2023年9月6日										
32	政府报验及消防部门竣工验收完成及取得相关批复文件	15 d	2023年8月23日	2023年9月6日										
33	竣工验收及空气治理阶段	8 d	2023年8月31日	2023年9月7日										
34	物理竣工, 客户对总包进行竣工预验收	1 d	2023年8月31日	2023年8月31日										
35	总包进行缺陷整改	4 d	2023年9月1日	2023年9月4日										
36	客户对总包进行竣工验收	1 d	2023年9月5日	2023年9月5日										
37	室内空气检测及出具报告	5 d	2023年9月2日	2023年9月6日										
38	现场实际完工并发布完工证明	1 d	2023年9月7日	2023年9月7日										
39	项目通风搬迁收尾阶段	8 d	2023年9月1日	2023年9月8日										
40	通风换气及设备试运行	7 d	2023年9月1日	2023年9月7日										
41	现场具备搬迁条件	1 d	2023年9月8日	2023年9月8日										

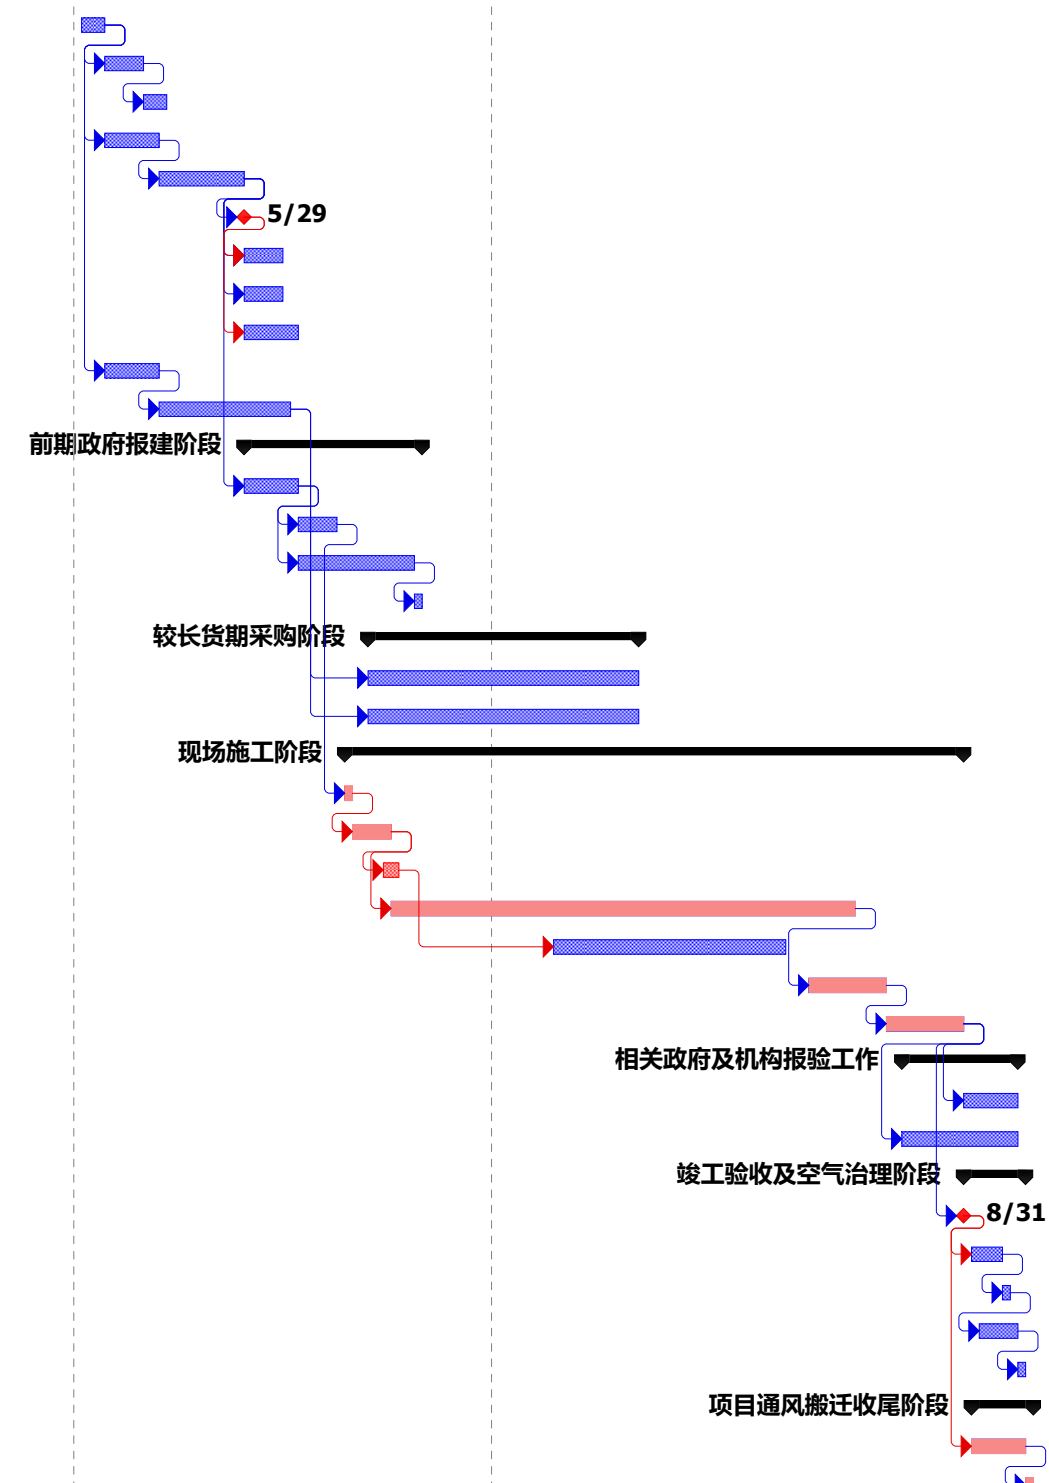

关键拆分	Project Summary	▬	手动任务	◇	仅完成时间	▬	关键	▬
Task	▬	External Tasks	▬	仅工期	外部任务	◇		
Split	External Milestone	◇	手动摘要总成	◆	外部里程碑	▬		
Milestone	◆	非活动里程碑	▬	手动摘要	◆	Progress	▬		
Summary	▬	非活动摘要	仅开始时间	▬	Deadline	⇅		
